




Information sur l'avancement des travaux de rénovation du château d'eau

Planning de la rénovation du château d'eau



PLANNING TRAVAUX - CHATEAU D'EAU DE MONTREUX VIEUX

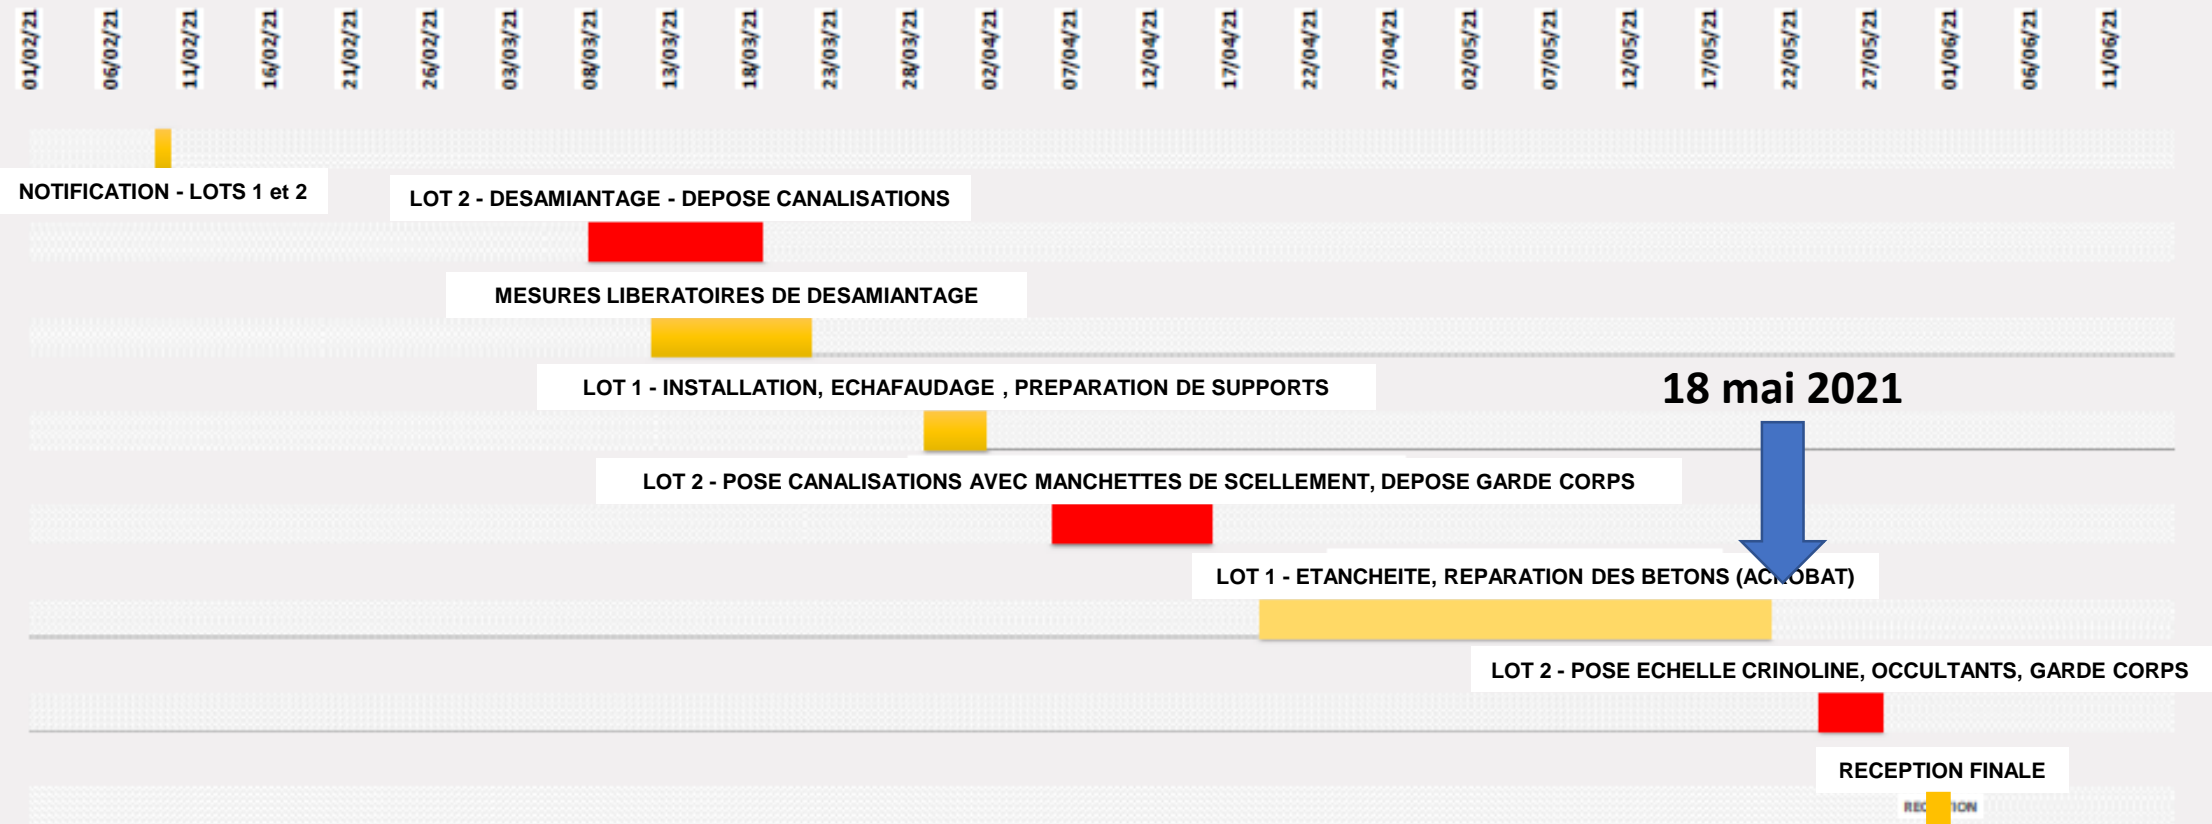

Avancement des travaux de rénovation du château d'eau



Fin de l'application de la couche d'imprégnation 650 g/m² et mise en place des bandes de tissu de verre 500 g/m² sur la paroi de la cuve.



6 mai 2021



6 mai 2021

Cuve après application de la couche de finition, avant séchage



11 mai 2021



Montage de la nouvelle tuyauterie inox à l'intérieur de la cuve de 200 m3



Cuve équipée avant désinfection et remise en eau du réseau



Prochaines étapes : Contrôle de potabilité et remise en service de la cuve semaine 21
